


Período del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 3

FONDO DESCENTRALIZADO, 2017

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							90,780,562.80	90,717,556.54			90,717,556.54
1	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	DIVERSAS CALLES	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	222,179	100%	m2	70,780,562.80	70,802,413.42	151,175.60		70,802,413.42
2	TRABAJOS DE BACHEO	DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	39,330	100%	m2	20,000,000.00	19,915,143.12			19,915,143.12

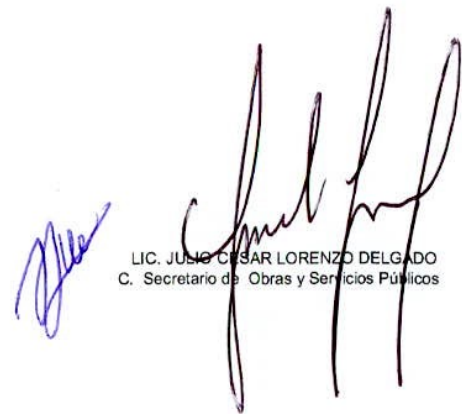

LIC. JULIO CESAR LORENZO DELGADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos
